

# 모듈형 음압생활치료센터 시공계획서 模块型 负压生活治疗中心 施工规划书

2020. 03

건축공사팀

建筑工程部

# 1. 공사개요 工程摘要


## 위치 地点



■ 경상북도 문경시 문경읍 마원리 942-2~4번지  
庆尚北道闻庆市

본 문서는 영업상 주요 자산으로서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 포함하여 관련 법령에 따라 그 전부 또는 일부를 무단으로 열람하거나 공개, 사용, 복제, 유출 등을 하는 행위는 엄격히 금지됩니다.


## 배치도 布置图

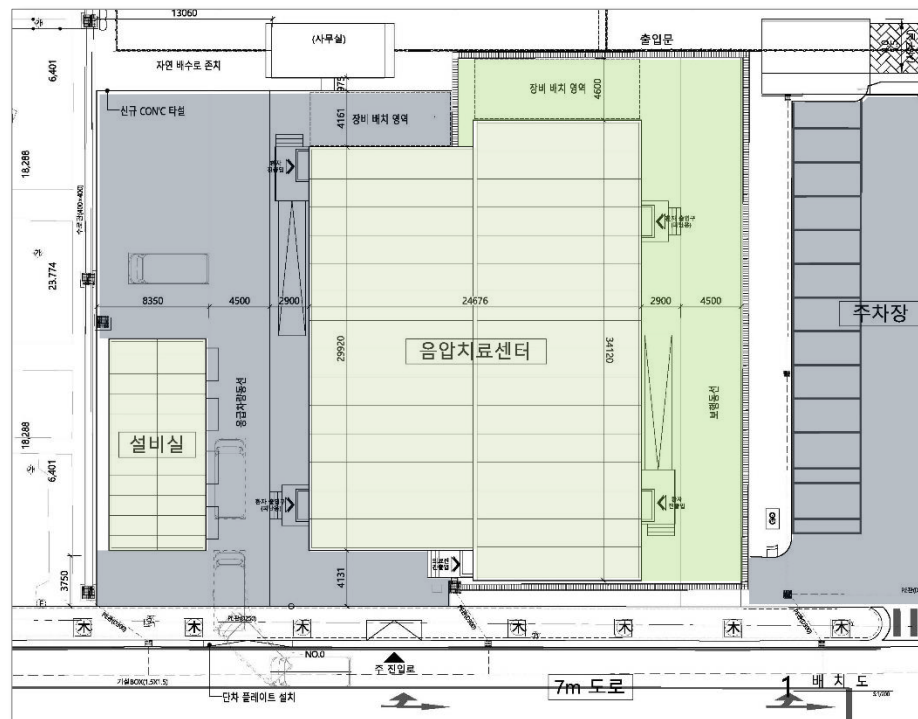









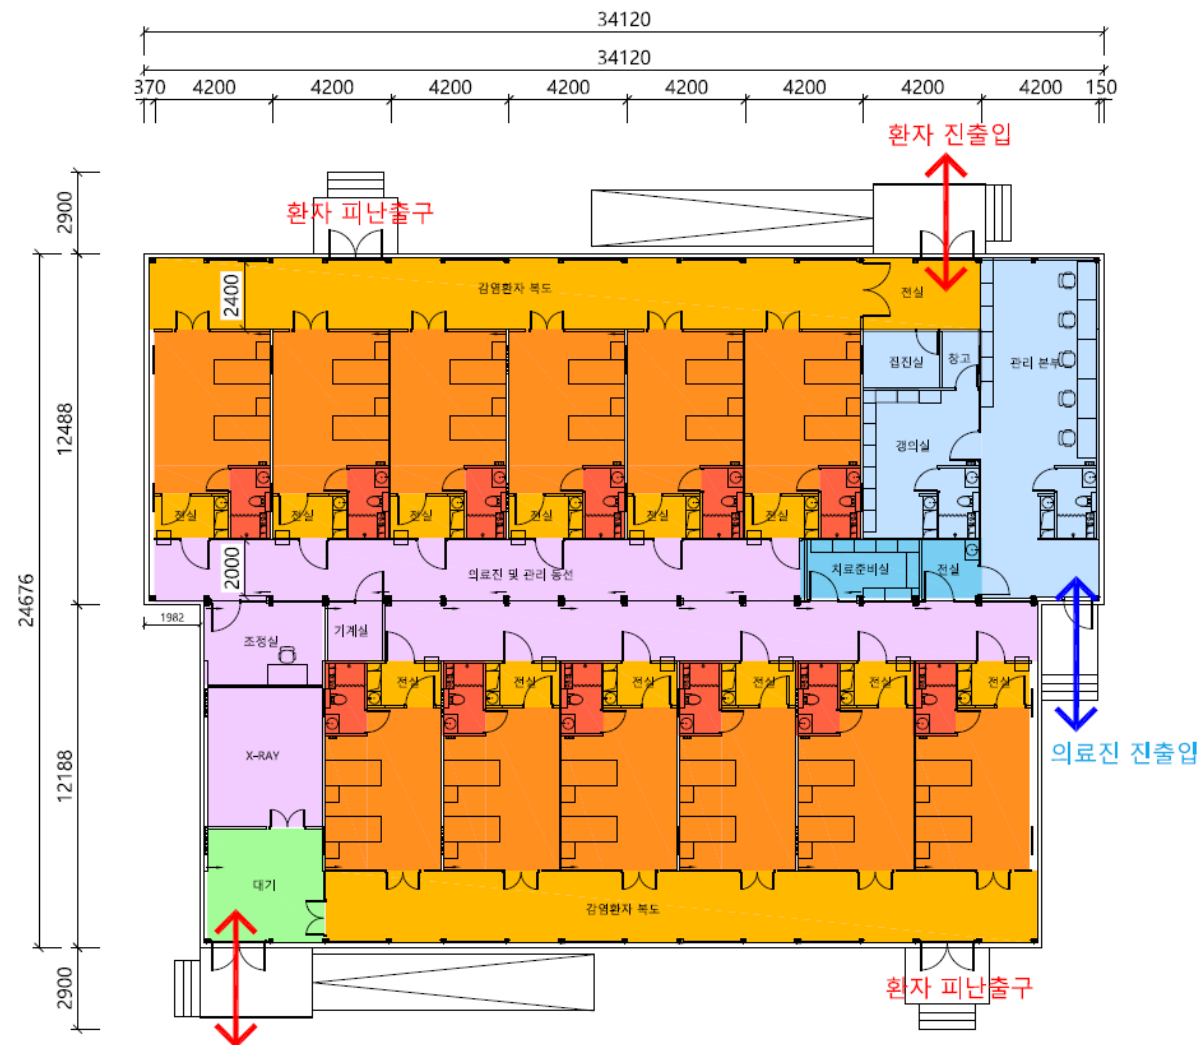


병상수病床	24 bed (12실, 2인 1실 병실) 12室, 2人1室
건축면적建筑面积	892.72 m <sup>2</sup> (병동病房781.96 / 설비실设备室110.76)
2인 병실 2人病房	<ul style="list-style-type: none"> <li>면적面积 : 29 m<sup>2</sup> / 각 실별 화장실 설치各房安装卫生间</li> <li>전실구성 (환자/의료진 동선 구분) 缓冲室结构 (区分病患者/医护人员走道)</li> </ul>
부속시설附属设施	<ul style="list-style-type: none"> <li>X-ray 촬영실, 치료준비실, 장비보관실, 소독실 X光摄影室、治疗准备室、设备保管室、消毒室</li> <li>세척실, 갱의실, 검체보관실 清洗室、更衣室、试料报关室</li> <li>업무공간 (관리본부) 业务空间 (管理本部)</li> </ul>

## 1. 공사개요 工程摘要


## 평면도 平面图



## 범례


동선		환자동선	
		의료진 동선	
의료진		의료진 영역 (Clean1)	 HIGH  LOW
		의료진 영역 (Clean2)	
		의료진 영역 (Clean3)	
		의료진 영역 (Clean4)	
환자		환자 영역 (Dirty1)	 HIGH  LOW
		환자 영역 (Dirty2)	
		환자 영역 (Dirty3)	
		환자 영역 (Dirty4)	

병실 크기



### 3. 가설계획 临时设置计划

#### 가설배치현황 临时设置布置现况

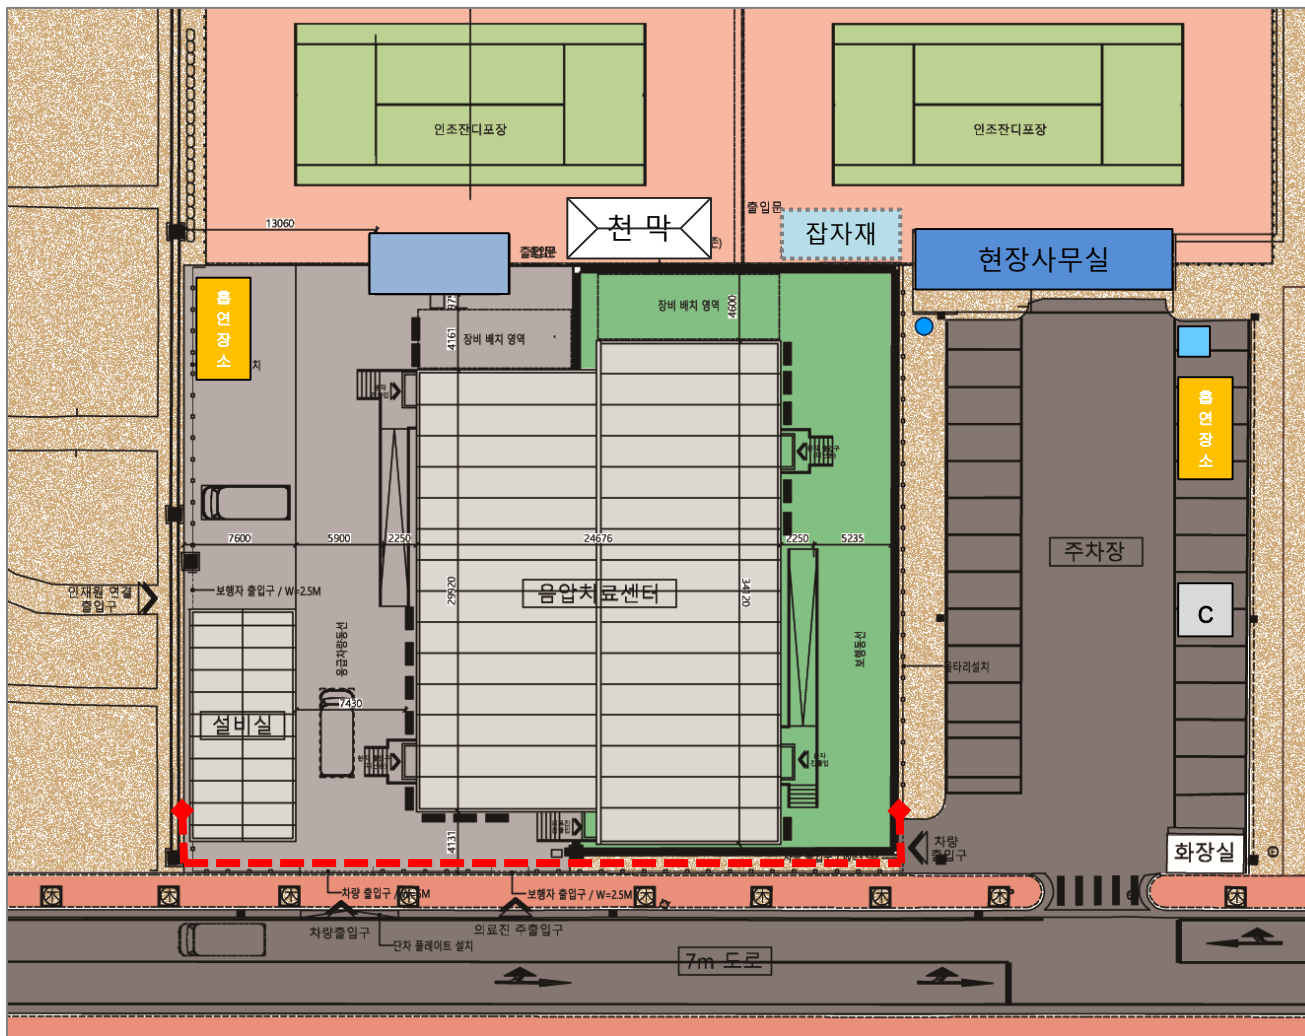


범 례 符 号	항 목 内 容	수 량 数 量
	간이화장실 临时卫生间	1EA
	가설용수 临时供水	1EA
	이동식천막 移动式布棚	1EA
	이동식휨스 移动式篱笆	60m
	흡연장소 吸烟地点	1EA

소방서용 컨테이너 (2m\*2m)  
消防用集装箱



## 4. Module 운송 模块运送



### SITE 확인 现场确认

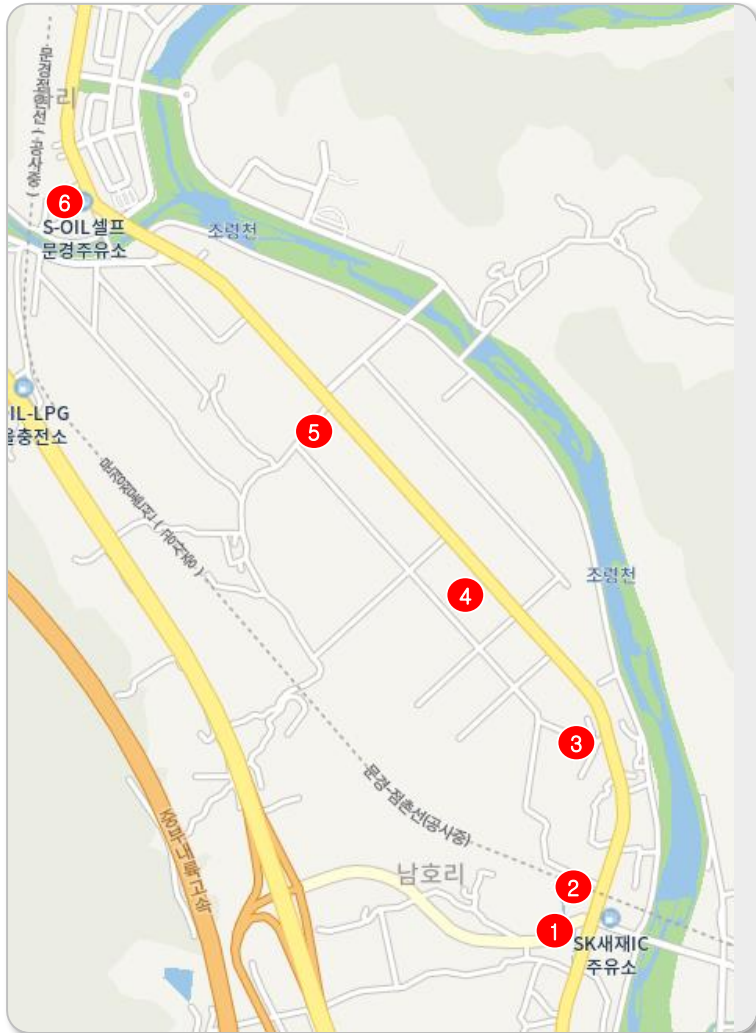



## 4. Module 운송 模块运送

### SITE 확인 现场确认

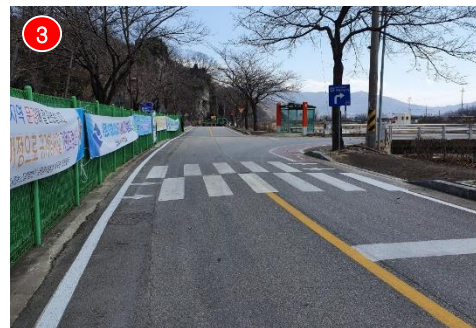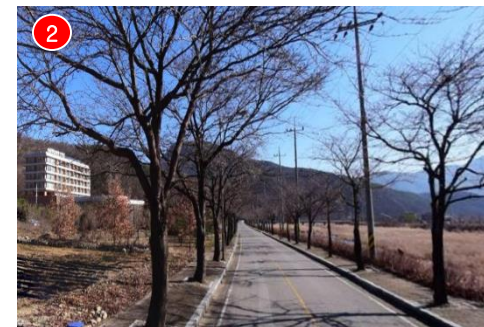


본 문서는 영업상 주요 자산으로서 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률을 포함하여 관련 법령에 따라 보호되는 중요한 정보를 포함하고 있으므로, 그 전부 또는 일부를 무단으로 열람하거나 공개, 사용, 복제, 유출 등을 하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

# 5. Module 시공 模块施工

## 장비 배치계획 设备布置计划

### [ STEP. 1 ]

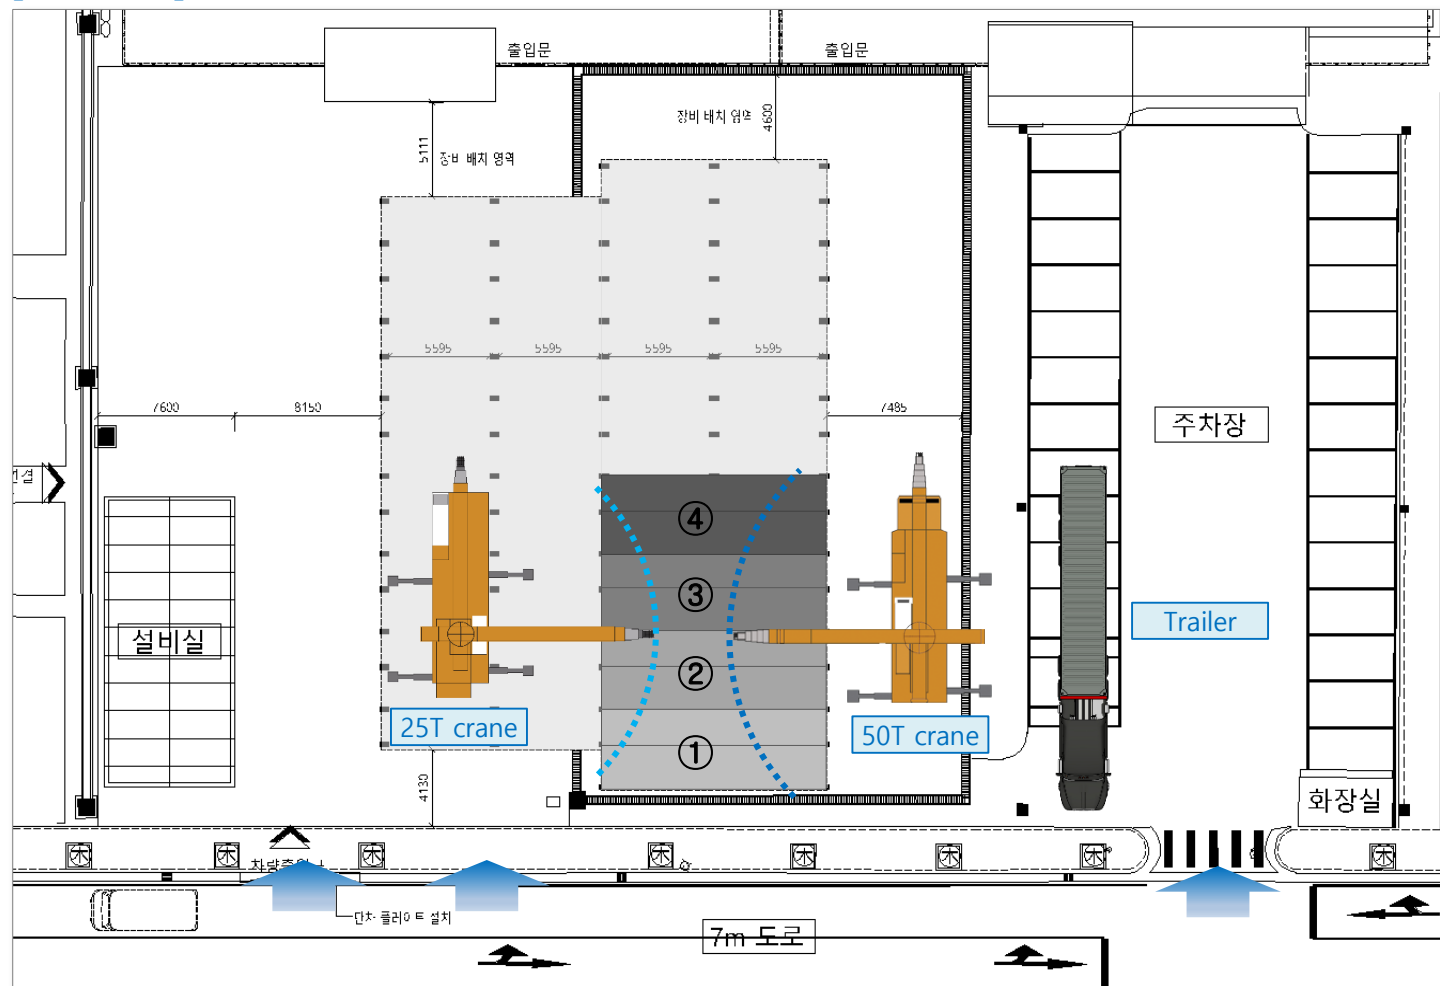


구분 区分	주요작업 主要工程
50T Crane 吊机	Module 하역/설치 模块卸货/安装
25T Crane 吊机	Module 벽체/지붕 시공 模块墙壁/屋顶施工
5T 지게차 叉车	설비 및 자재 운반 设备和建材运送

# 5. Module 시공 模块施工

## 장비 배치계획 设备布置计划

### [ STEP. 1 ]

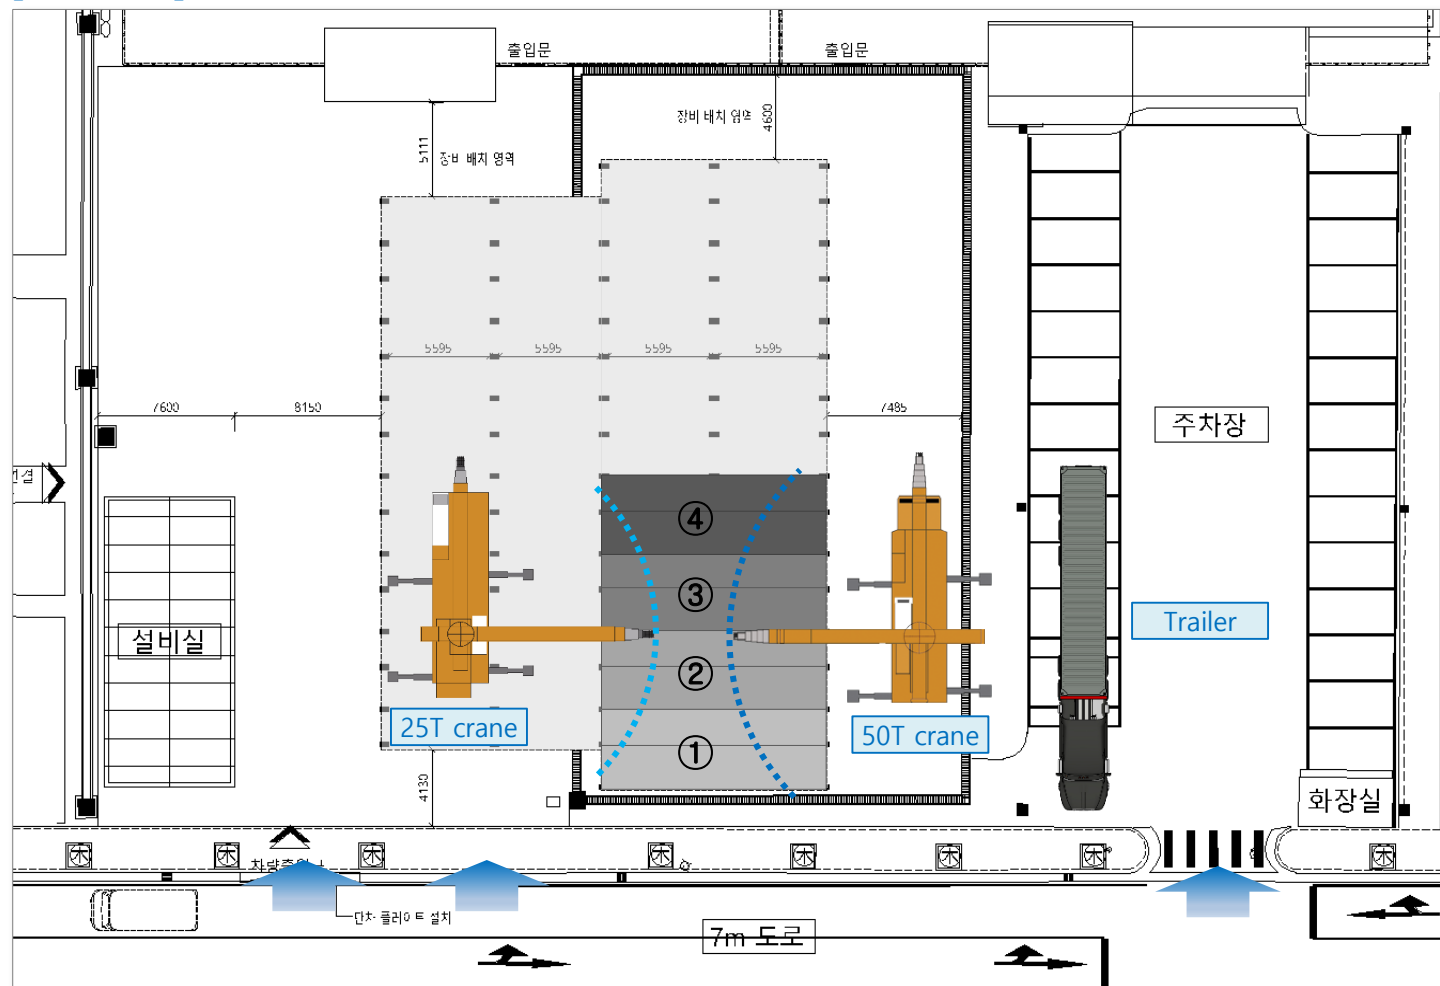


구분 区分	주요작업 主要工程
50T Crane 吊机	Module 하역/설치 模块卸货/安装
25T Crane 吊机	Module 벽체/지붕 시공 模块墙壁/屋顶施工
5T 지게차 叉车	설비 및 자재 운반 设备和建材运送



# 5. Module 시공模块施工

## 장비 배치계획 设备布置计划

### [ STEP. 2 ]

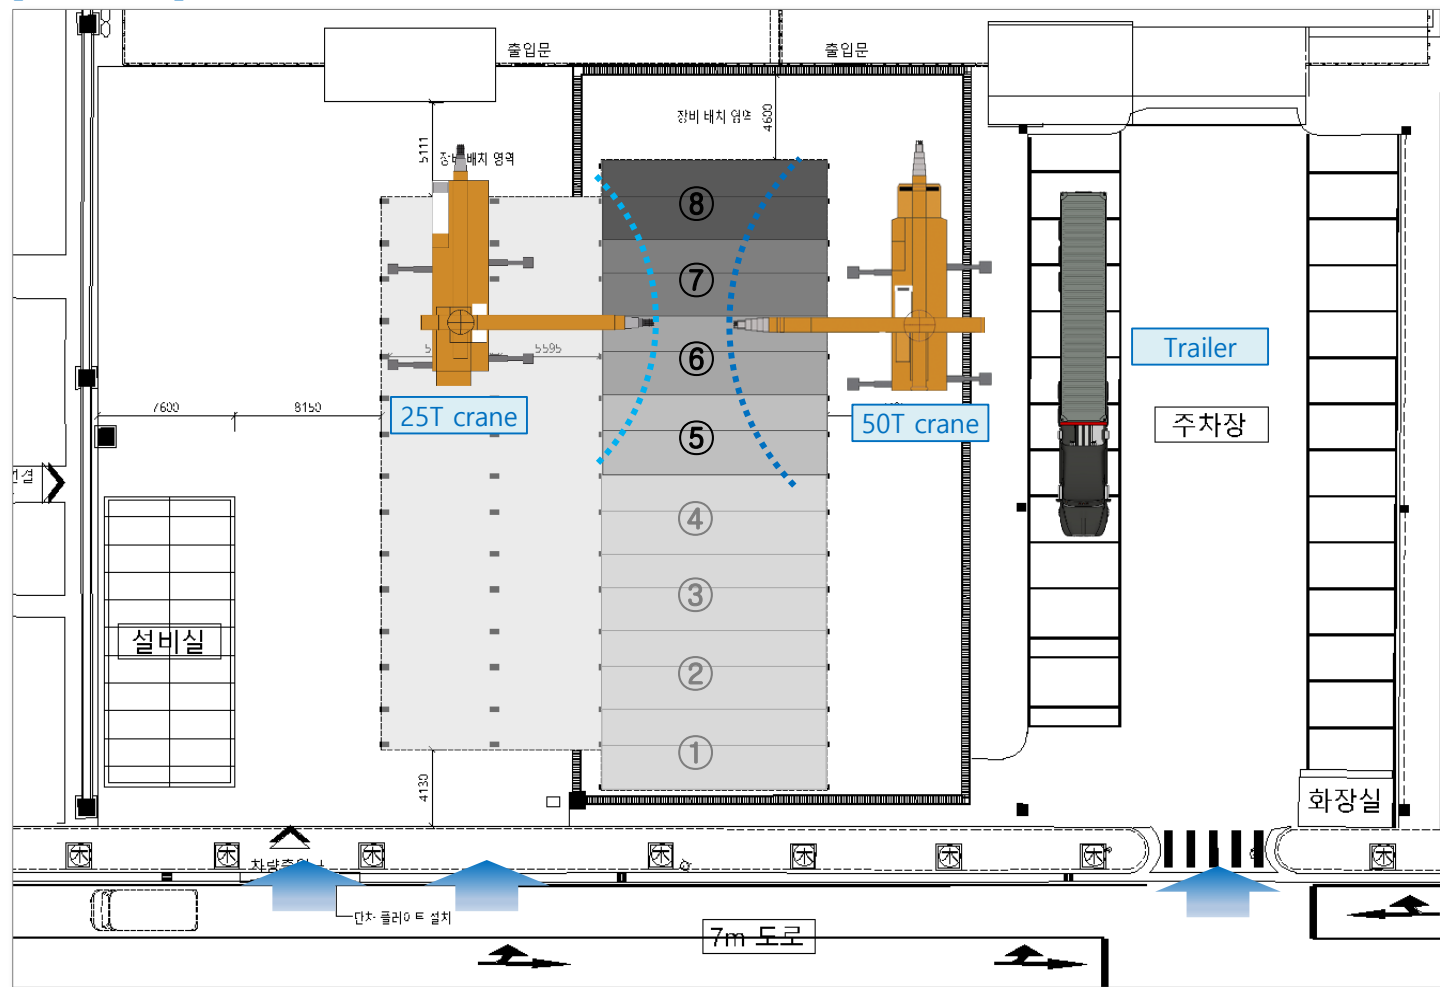


구분 区分	주요작업 主要工程
50T Crane 吊机	Module 하역/설치 模块卸货/安装
25T Crane 吊机	Module 벽체/지붕 시공 模块墙壁/屋顶施工
5T 지게차 叉车	설비 및 자재 운반 设备和建材运送

# 5. Module 시공模块施工

## 장비 배치계획设备布置计划

### [ STEP. 3 ]

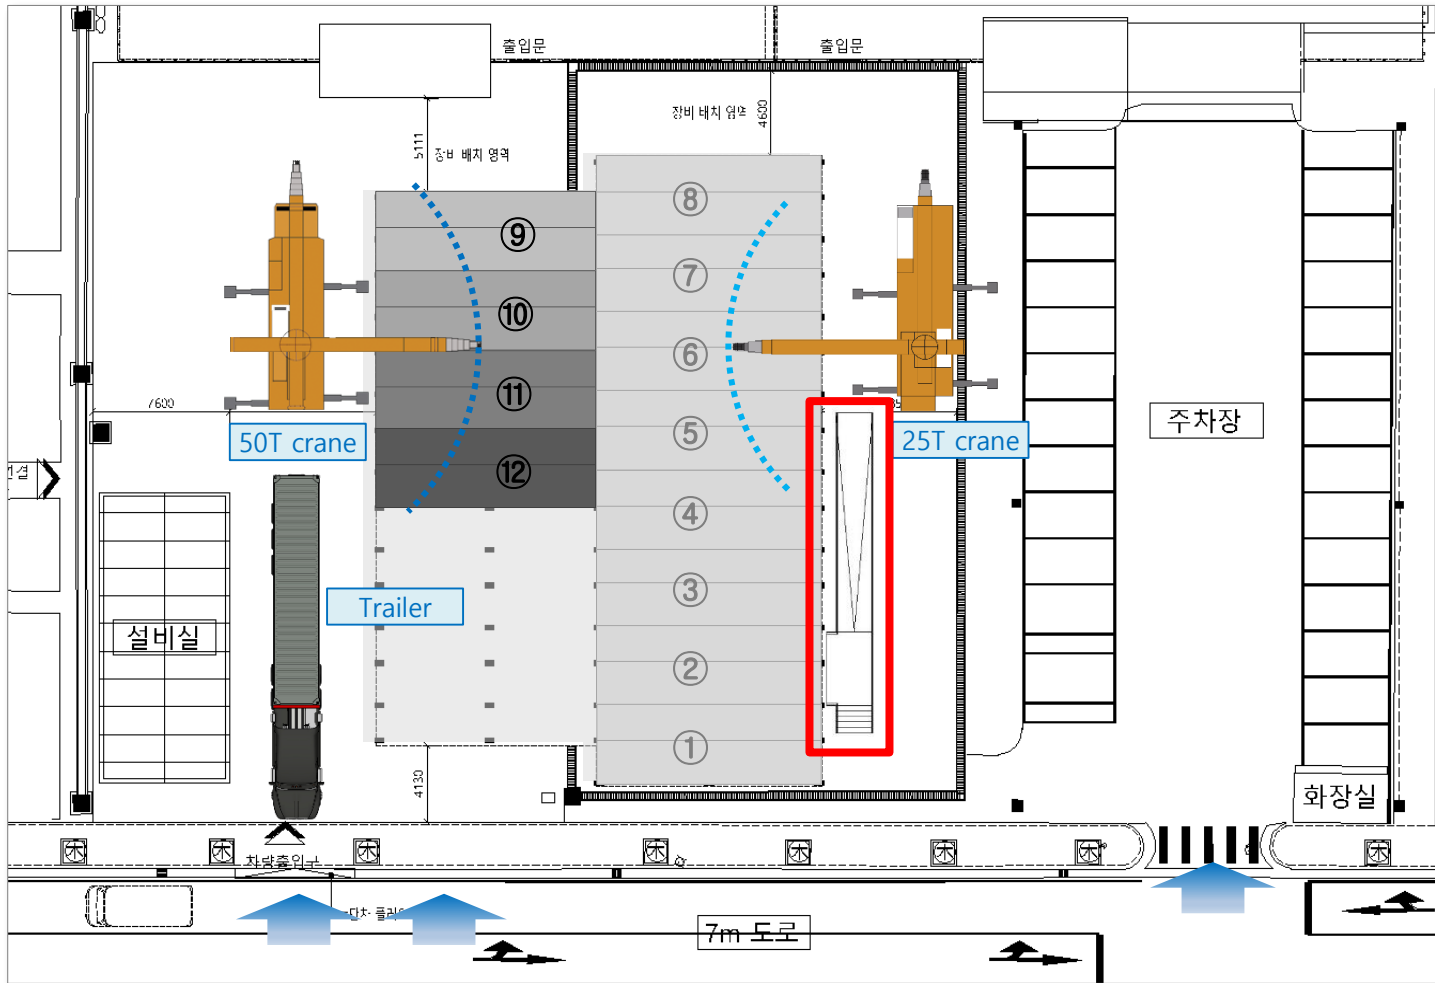


구분 区分	주요작업 主要工程
50T Crane 吊机	Module 하역/설치 模块卸货/安装
25T Crane 吊机	Module 벽체/지붕 시공 模块墙壁/屋顶施工
5T 지게차 叉车	설비 및 자재 운반 设备和建材运送

# 5. Module 시공模块施工

## 장비 배치계획设备布置计划

### [ STEP. 4 ]

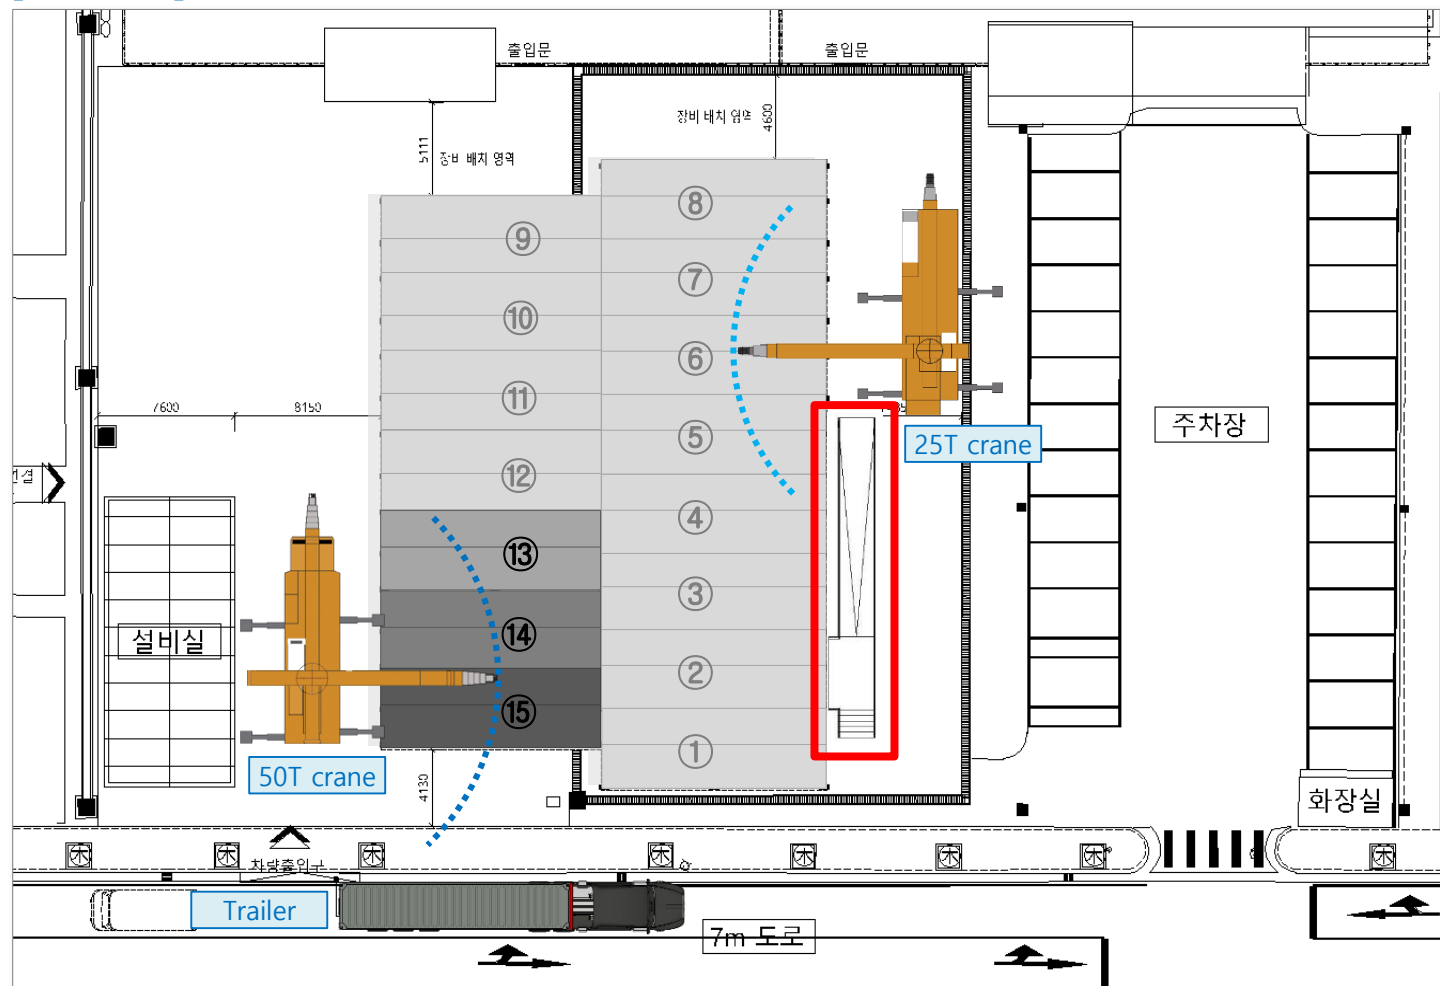


구분 区分	주요작업 主要工程
50T Crane 吊机	Module 하역/설치 模块卸货/安装
25T Crane 吊机	Module 벽체/지붕 시공 模块墙壁/屋顶施工
5T 지게차 叉车	설비 및 자재 운반 设备和建材运送



# 5. Module 시공模块施工

## 장비 배치계획设备布置计划



### [ STEP. 5 ]

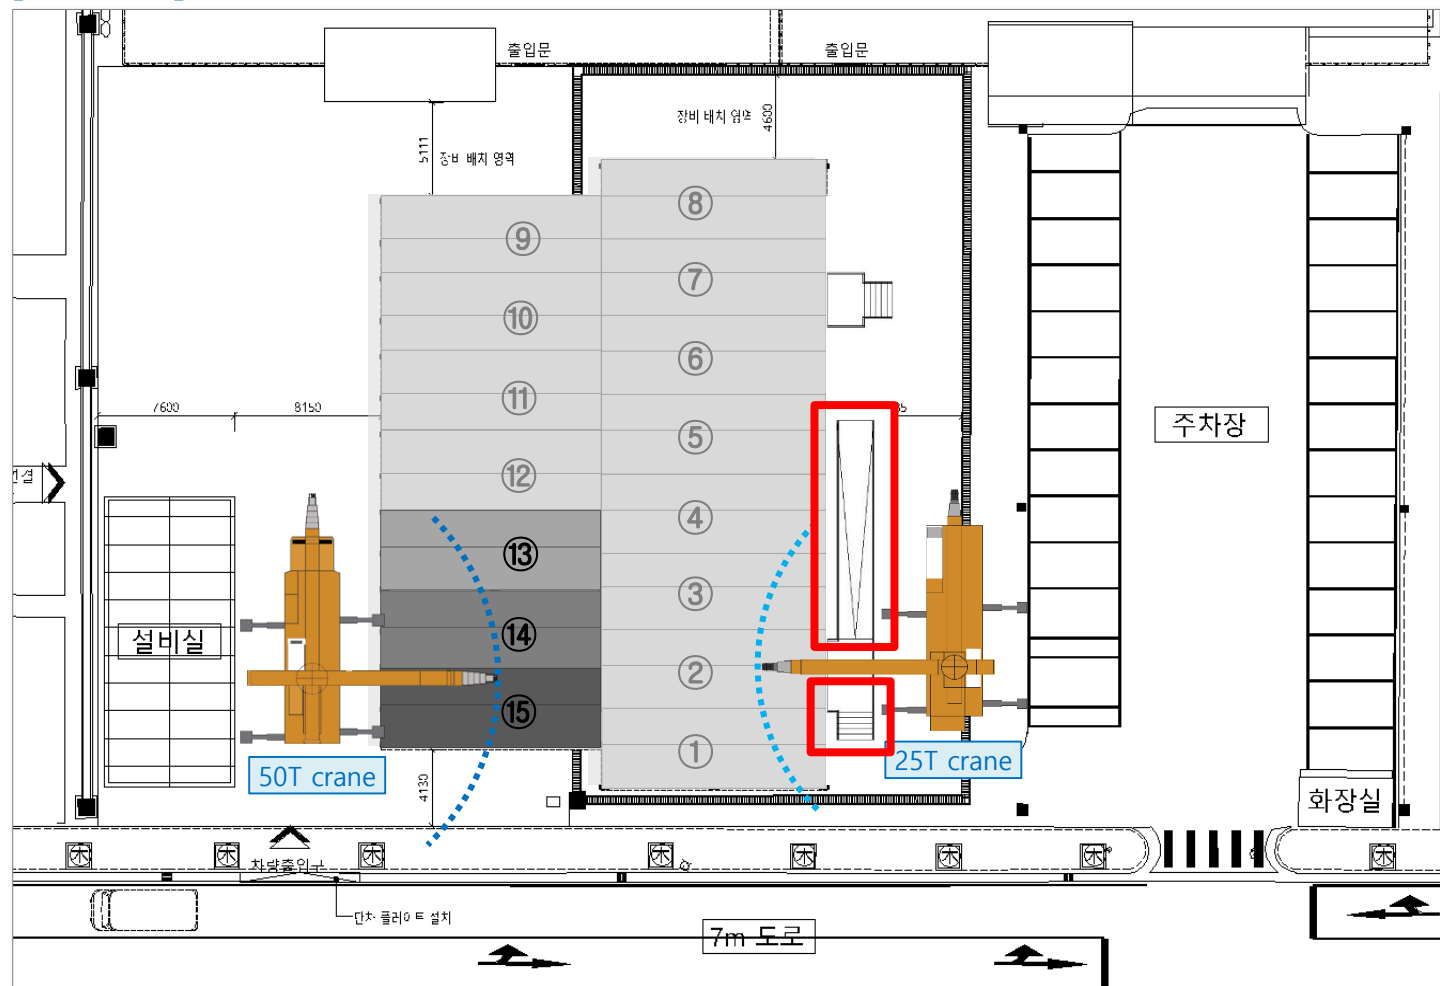

구분 区分	주요작업 主要工程
50T Crane 吊机	Module 하역/설치 模块卸货/安装
25T Crane 吊机	Module 벽체/지붕 시공 模块墙壁/屋顶施工
5T 지게차 叉车	설비 및 자재 운반 设备和建材运送

# 5. Module 시공 模块施工

## 모듈 시공순서 模块安装顺序

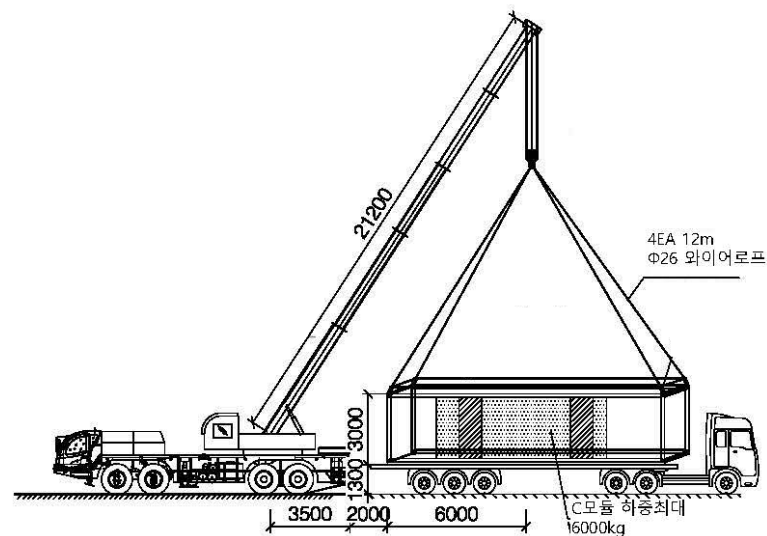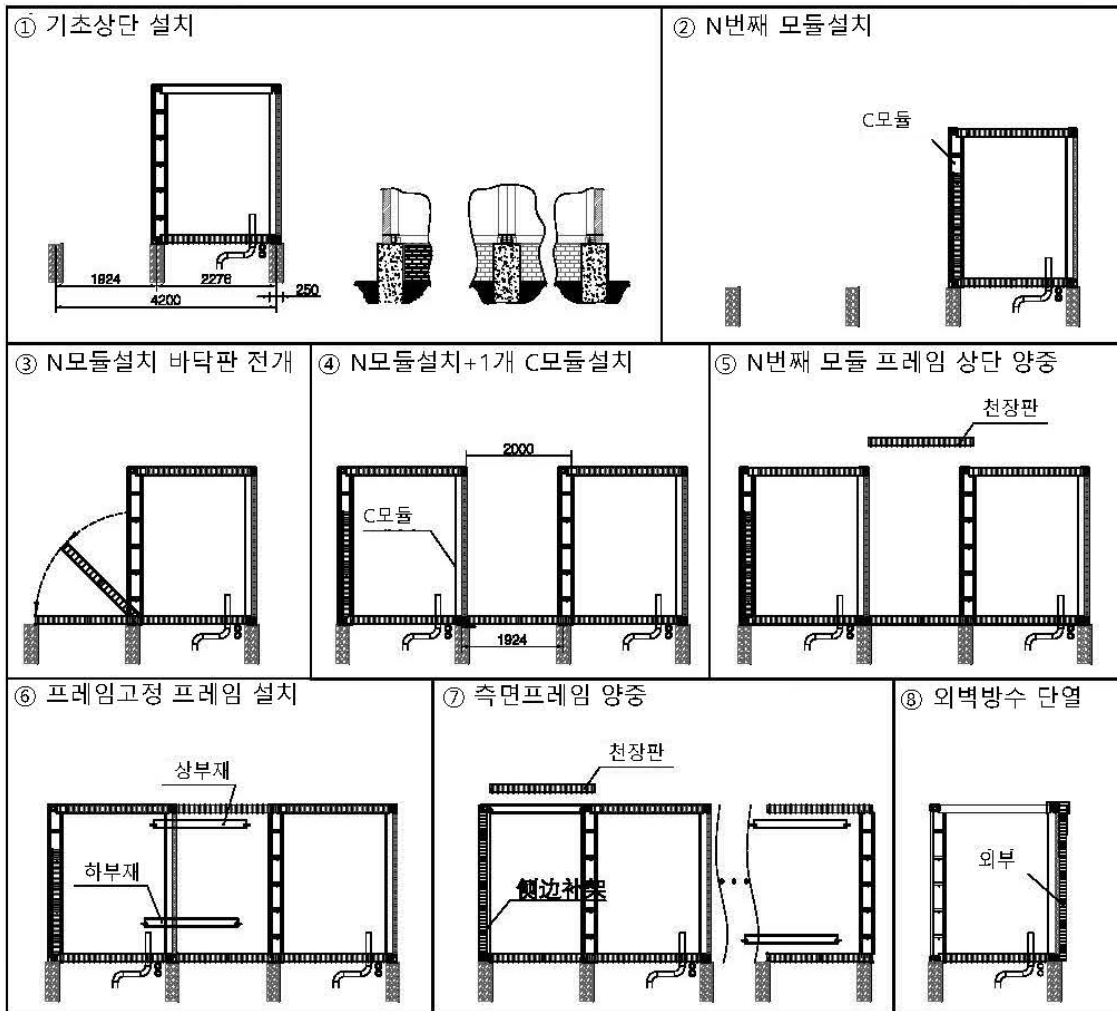

## 5. Module 시공 模块施工

### 기상현황 天气现状 • 3월 25일 14시 기준 3月25日14时确认



- 예보확인(기상청) : [http://www.weather.go.kr/weather/forecast/mid-term\\_06.jsp](http://www.weather.go.kr/weather/forecast/mid-term_06.jsp)

### [ 검토사항 ] 检讨事项

- 모듈조립 : 27일~29일 模块安装 : 3月27日~29日
- 모듈 Packing 模块包装 : PE재질로 포장되어 있음 PE包装 ▶ Broad社 에 우천시 보양방안 협의 需确认下雨时解决方案
- 중국인 기술자 체류연장에 따른 예약사항 변경 확인 需要确认停留期间延长时方案
